

令和7年度 第3回 尾張北部環境組合公害防止準備委員会 次第

日時 令和8年2月24日(火)

午後2時00分から

場所 建設工事現場事務所

1 挨拶

2 議事

(1) 新ごみ処理施設建設工事の進捗状況について

(2) 令和8年度の工事計画について

(3) ごみ処理施設への通行ルートについて

3 その他

(1) 建設工事の現場確認

《配付資料》

資料1 工事進捗状況報告

資料2 ごみ処理施設建設工事 令和8年度 工事計画

資料3 ごみ処理施設への通行ルート

工事進捗状況報告

工事用のホームページでは、現在までに「2023年8月末～2026年1月末」までの定点写真を掲載しております。

(ごみ処理施設建設工事ホームページURL：<https://owarihokubu.com>)



工事用ホームページQRコード

次ページより、今年度のうち隔月（2025年5・7・9・11月、2026年1月）の定点写真及び施工状況の工事写真を添付いたします。

2025年5月 末 定点写真



2025年5月 末 定点写真 ①



2025年5月 末 定点写真 ②



2025年5月 末 定点写真 ③



2025年5月 末 定点写真 ④



2025年5月 末 定点写真 ⑤



2025年5月 末 撮影位置

2025年7月 末 定点写真



2025年7月 末 定点写真 ①



2025年7月 末 定点写真 ②



2025年7月 末 定点写真 ③



2025年7月 末 定点写真 ④



2025年7月 末 定点写真 ⑤



2025年7月 末 撮影位置

2025年9月 末 定点写真



2025年9月 末 定点写真 ①



2025年9月 末 定点写真 ②



2025年9月 末 定点写真 ③



2025年9月 末 定点写真 ④



2025年9月 末 定点写真 ⑤



2025年9月 末 撮影位置

2025年11月 末 定点写真



2025年11月 末 定点写真 ①



2025年11月 末 定点写真 ②



2025年11月 末 定点写真 ③



2025年11月 末 定点写真 ④



2025年11月 末 定点写真 ⑤



2025年11月 末 撮影位置

2026年1月 末 定点写真



2026年1月 末 定点写真 ①



2026年1月 末 定点写真 ②



2026年1月 末 定点写真 ③



2026年1月 末 定点写真 ④




2026年1月 末 定点写真 ⑤



2026年1月 末 撮影位置

工事施工状況写真

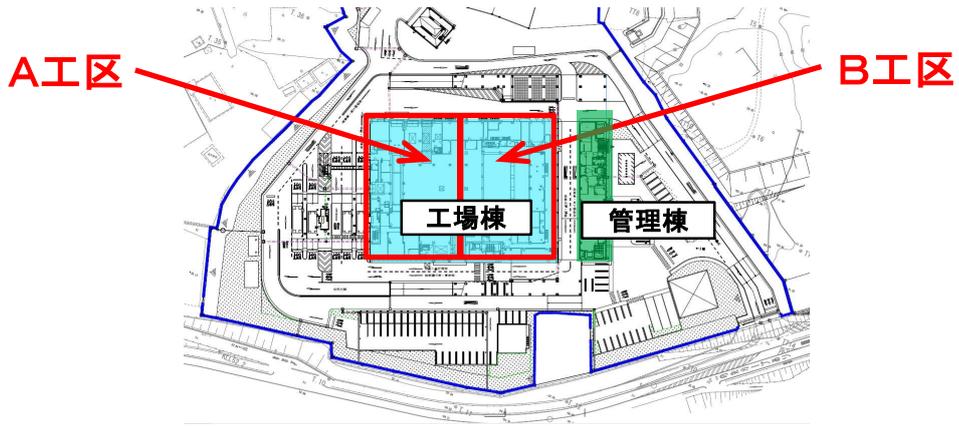

2025年4月 A工区 地盤アンカー工事



2025年4月 B工区 未着手



2025年5月 A工区 基礎工事



2025年5月 B工区 山留工事



2025年6月 A工区 基礎工事



2025年6月 B工区 山留工事

工事施工状況写真



2025年7月 A工区 基礎工事



2025年7月 B工区 土工事(1次掘削)



2025年8月 A工区 基礎工事




2025年8月 B工区 土工事(2次掘削)



2025年9月 A工区 1階床工事



2025年9月 B工区 土工事(2次掘削)

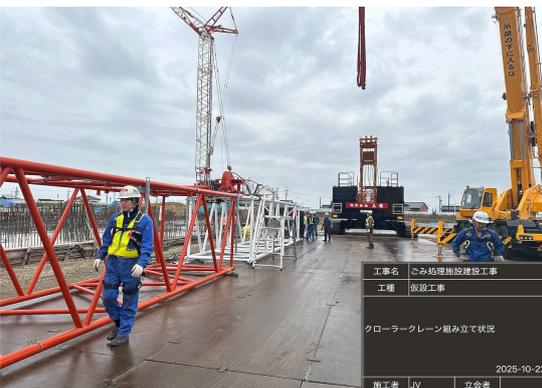

2025年10月 A工区 クレーン組立



2025年10月 B工区 土工事完了(支持層確認)

工事名 〇み処理施設建設工事
工種 仮設工事
クローラークレーン組み立て状況
2025-10-22
施工者 JV 立会者

工事施工状況写真




2025年11月 A工区 鉄骨工事




2025年11月 B工区 基礎躯体工事



2025年12月 A工区 鉄骨工事(本締め)

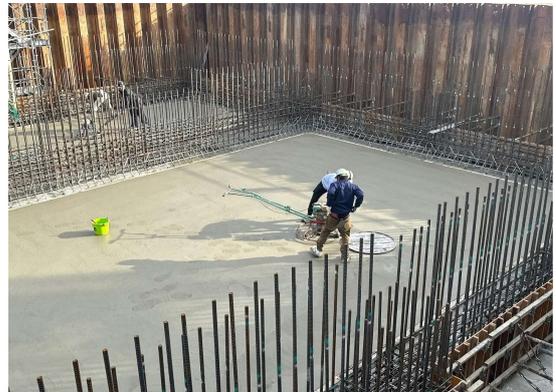

2025年12月 B工区 コンクリート工事

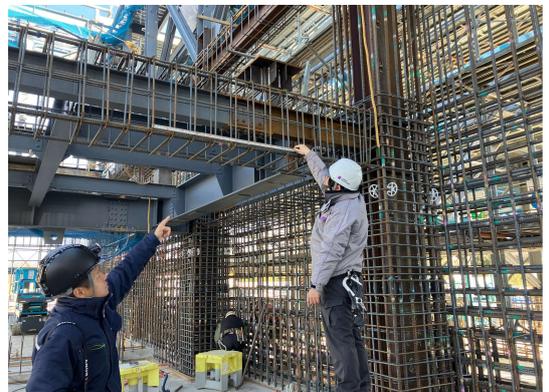

2026年1月 A工区 地上躯体工事



2026年1月 B工区 地下躯体工事



【工場棟・管理棟】工事予定
 土工事、基礎躯体工事（鉄筋/型枠/コンクリート）、
 地上躯体工事（鉄筋/型枠/コンクリート/鉄骨）、
 仮設工事（仮設足場他）、内外装工事、
 プラント工事（鉄骨/機器据付/配管敷設）

【付属棟】特別高圧受変電設備、洗車棟、火災廃棄物仮置場、不法投棄ごみ仮置場
 R8年度内工事着手予定

【別途工事】 令和7年度工事
 ・県道拡幅工事
 （令和7年10月～令和8年3月）

【別途工事】 令和8年度工事
 ・県道拡幅工事
 ・片側交互通行
 （令和8年10月～令和9年3月）

【別途工事】 令和6年度工事
 ・県道拡幅工事
 （令和6年10月～令和7年5月）

【工食用出入口】
 ・左折進入、左折退場（場合により例外あり）
 ・誘導員を配置
 ・特殊車両による大型機器の搬入
 （原則午前6:00までに現場内で待機）

【作業員出入口】
 ・南西側のゲートは引き続き使用します
 （通勤車両及び作業員の出入り）

佐藤工業・昭和土建・松岡建設
 特定建設工事共同企業体

ごみ処理施設建設工事
 令和8年度 工事計画



ごみ処理施設への通行ルート

← 主要ルート - - - 通行しない（この区間周辺のごみを収集運搬する際は通行します）



地図出典：国土地理院地図を加工
